


鴨川上流の流木止め効果について

ナカツガワコウヤマ
鴨川の上流に位置する中津川向山砂防えん堤の上流側に流木捕捉工を設置
令和3年5月20日～21日の梅雨前線豪雨に際し大量の流木が捕捉され、下流域における流木被害が軽減

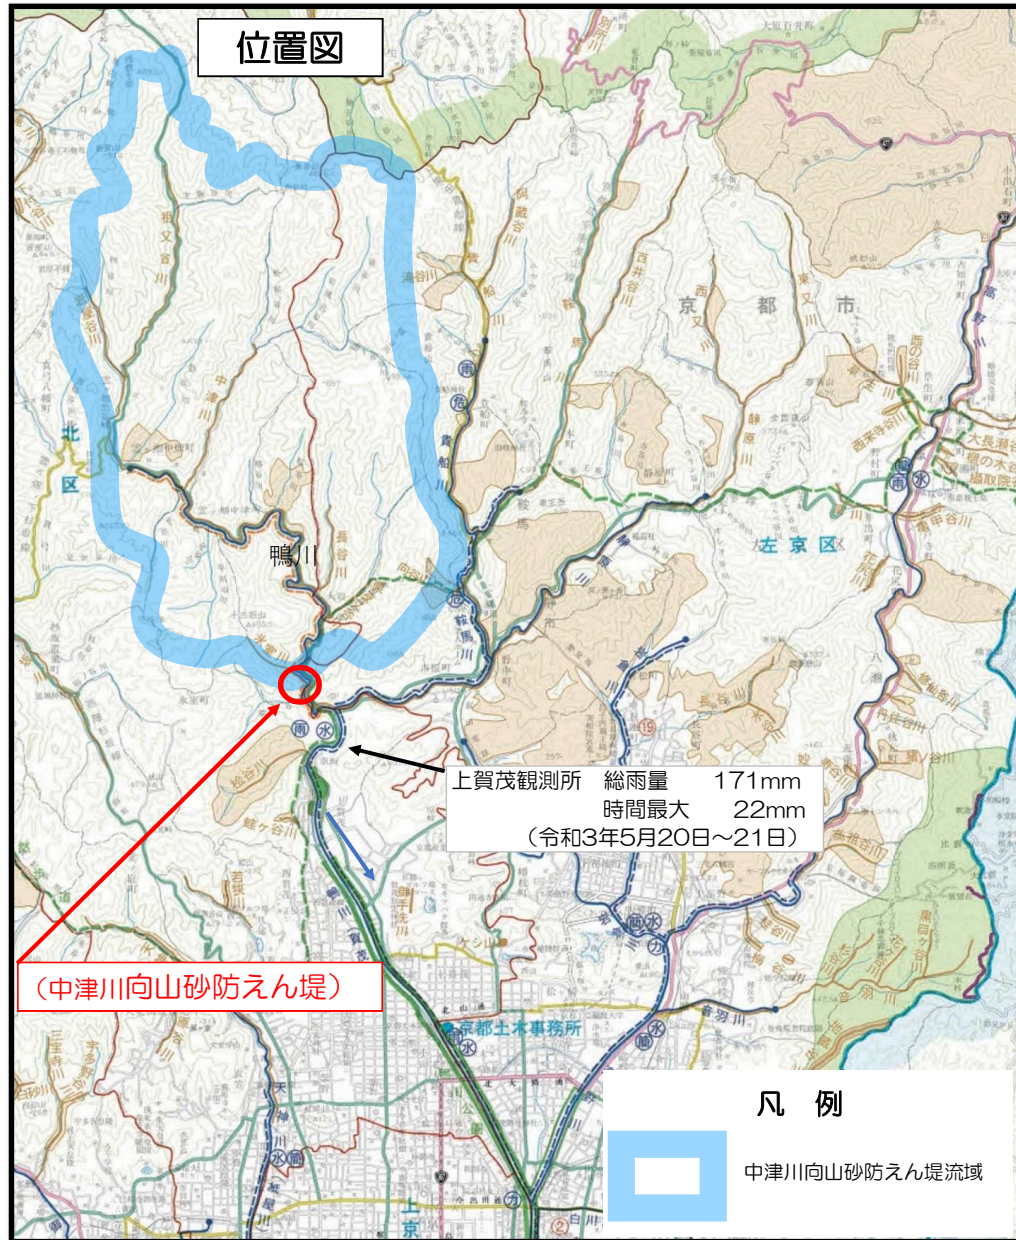


令和3年5月21日 午前11時頃撮影

【流木撤去工事】

- 工事内容：仮設道路設置 約80m、流木処理 一式
- 処 理 量：約90 t（約170m³）
- 工事期間：令和3年10月上旬～令和3年11月中旬（撤去のみ10日程度）
- 処 分 先：(株)フォース（南丹市日吉町）
- 処分方法：チップ化（発電用燃料）
（当初は、製紙用のパルプ化（ほぼ費用が不要）を検討 → 流下中に石等が幹に混入のため×）



令和3年5月21日 撮影



令和3年11月12日 撮影
