

施設名	田原川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町佐々江
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	土砂が堆積しているようには見えるが、河床低下により護岸基礎が一部流出している。
-------	---

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（河床低下の傾向がある。河床及び護岸基礎の経過観察を続ける。）

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

235

施設名	胡麻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町胡麻
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	土砂の堆積も見られるが、水衝部は低下の傾向にある。
-------	---------------------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない（再調査の結果、土砂浚渫量の増加が見られたため、実施②とする。）


府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

236

施設名	京都日吉美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町殿田
提案内容	舗装修繕

現在の状況	舗装が全体的に沈下しており、構造物との境に段差が発生し降雨時には水がたまっている形跡がある。
-------	--

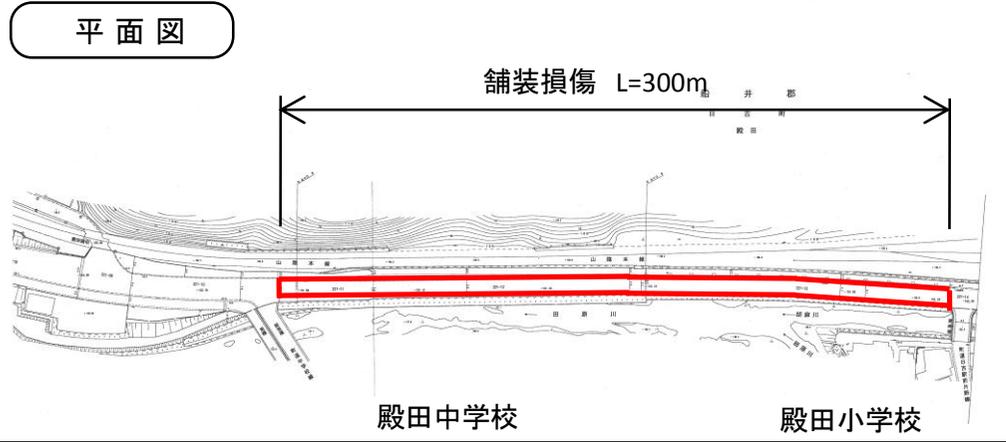

審査結果	実施① (市町村協働 日一(区画線)と合わせて実施)
------	----------------------------

施設名	奥津原川(砂防)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町神吉 揚岸
提案内容	河床コンクリート張
現在の状況	河床張りコンクリートが流出している。

現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施②


施設名	京都日吉美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町神吉
提案内容	柵及び横断管の改修

現在の状況	農業水路からの水が溢れ柵及び張りコン下部が洗掘されたものと考えられる。また、境界杭の位置から道路区域外の施設である。
-------	--

位置図

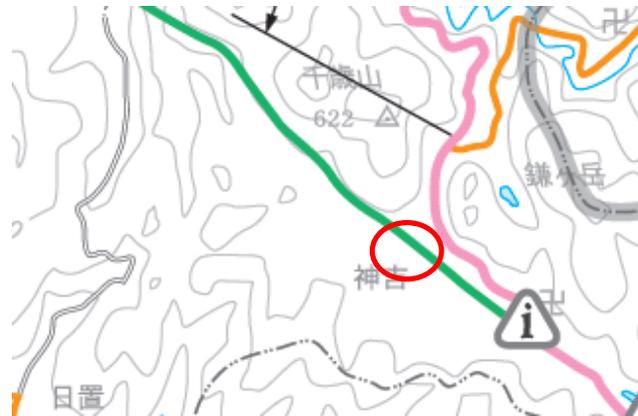

平面図

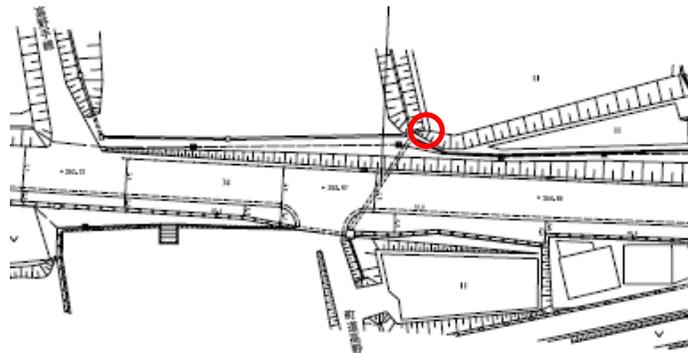


現況写真




審査結果	実施しない（道路区域外であり、施設管理者(用水施設)の対応であるため。）
------	--------------------------------------

施設名	原川(砂防)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町原
提案内容	土砂浚渫及び堰堤改修
現在の状況	水叩きが流出し土砂が堆積している。


現況写真

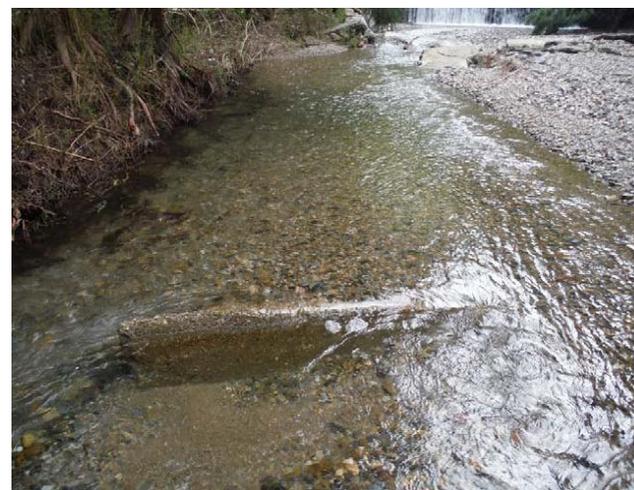

位置図

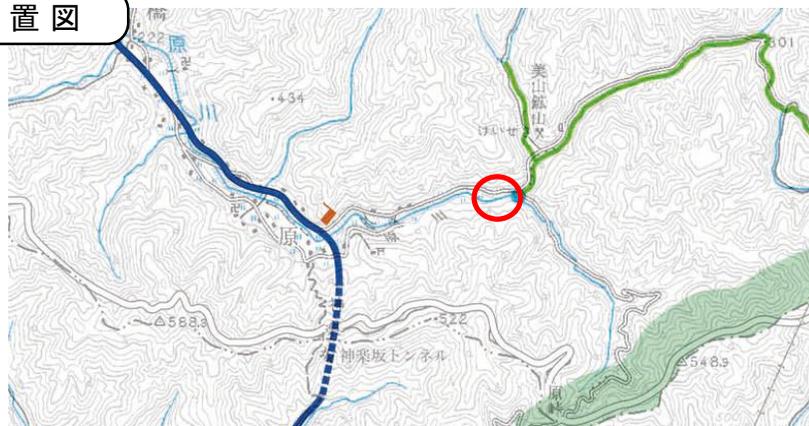

平面図

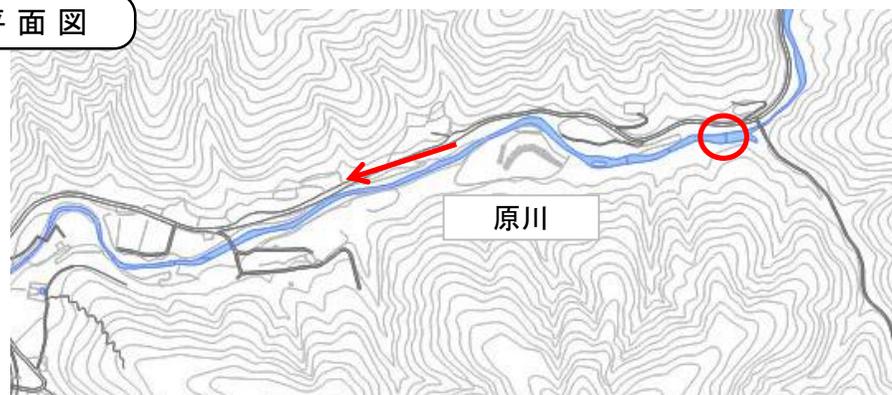

審査結果


他事業で実施

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

262

施設名	園部能勢線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町法京
提案内容	減速の路面表示
現在の状況	道路幅員が広く、勾配もあるため、通行する車両はスピードが出やすくなっている。

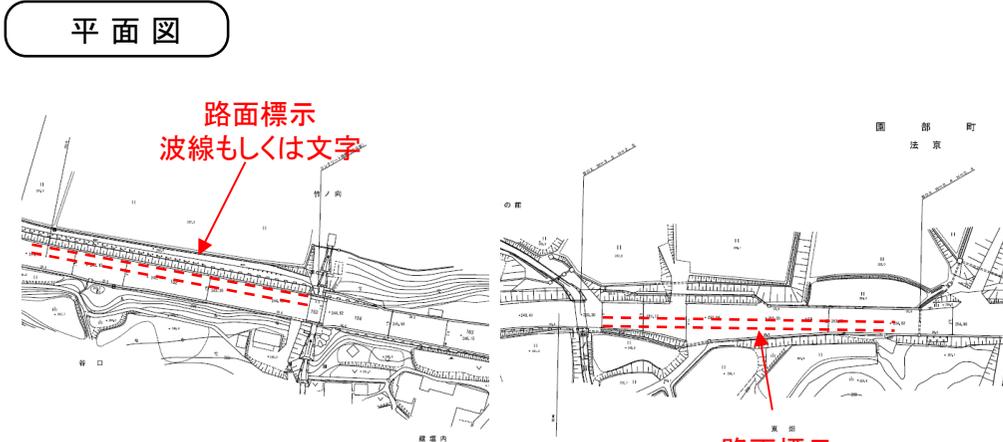


審査結果

実施①


施設名	奥山川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町天引(No.63 64 65 66 67 68 69 70 71)
提案内容	護岸修繕、土砂浚渫等

現在の状況	河床低下等により背面土砂を含めて流亡、護岸が破損している箇所が見られる。
-------	--------------------------------------

位置図

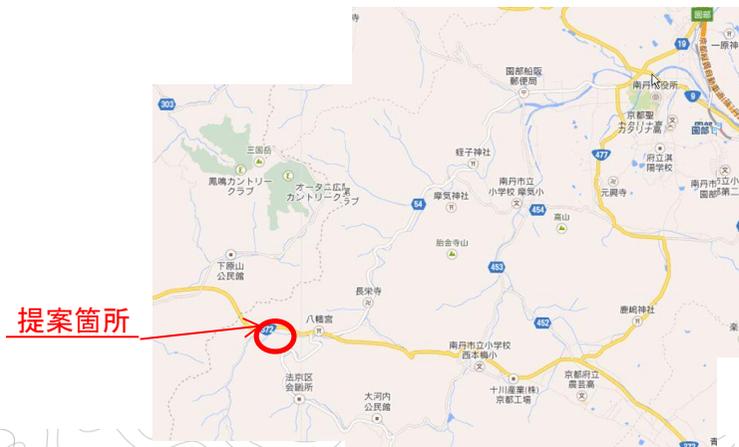

平面図

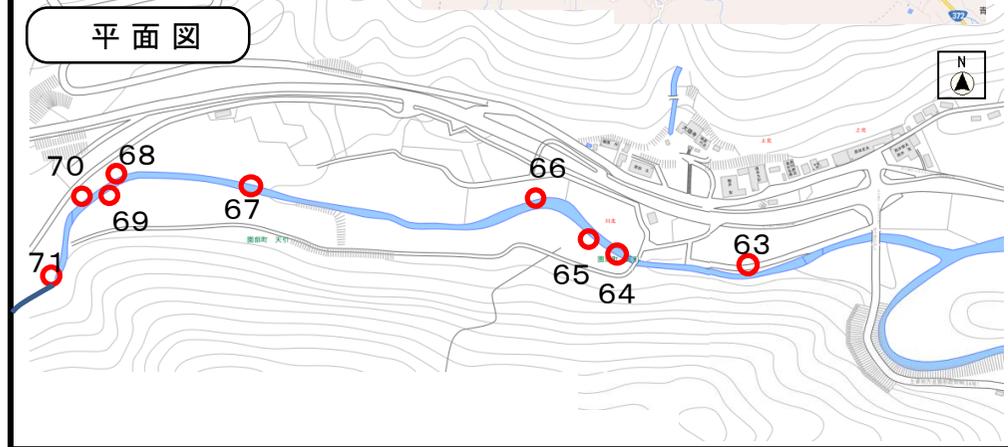

現況写真

63

通常流水部ではないが
管理用通路への影響



審査結果

実施② (提案箇所63,64,68~70のみ実施、提案箇所65,66,71は他事業で実施)

現況写真

64

石積護岸
流出



65

石積み
護岸が破損
(補修済)



現況写真

66

河床低下により護岸裏の土砂が流亡していた箇所
(補修済)



67

提案箇所
周辺
大きな変
状なし



現況写真

68

石積み護岸
が破損



69

石積み護
岸が破損



現況写真

70

石積み護岸
が破損



71

石積み護岸
が破損




府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号


267

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町天引(42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62)
提案内容	護岸修繕、土砂浚渫等
現在の状況	河床低下等により背面土砂を含めて流亡、護岸が破損している箇所が見られる。

平面図

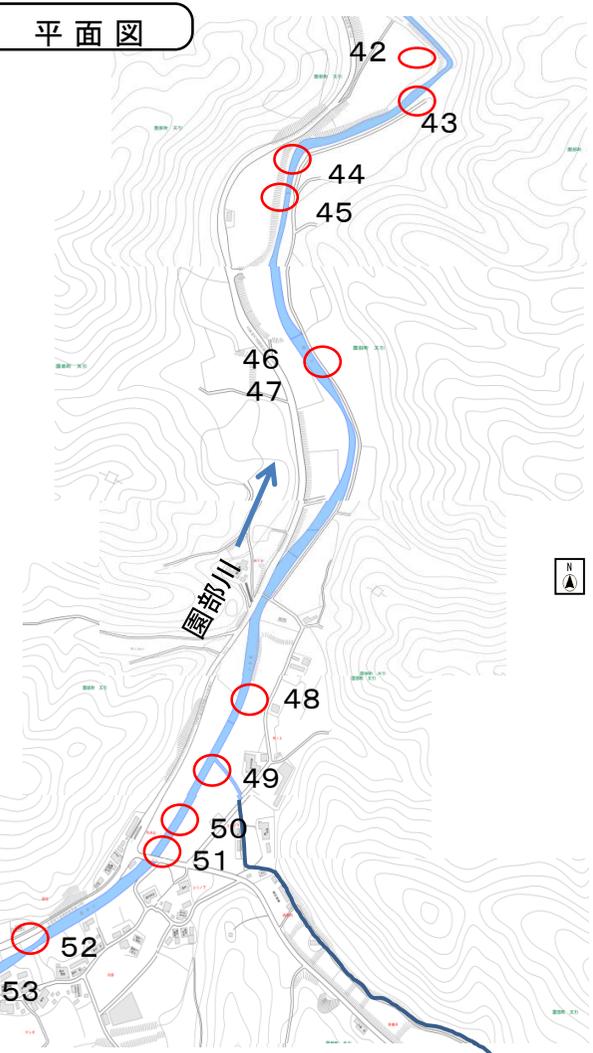

位置図

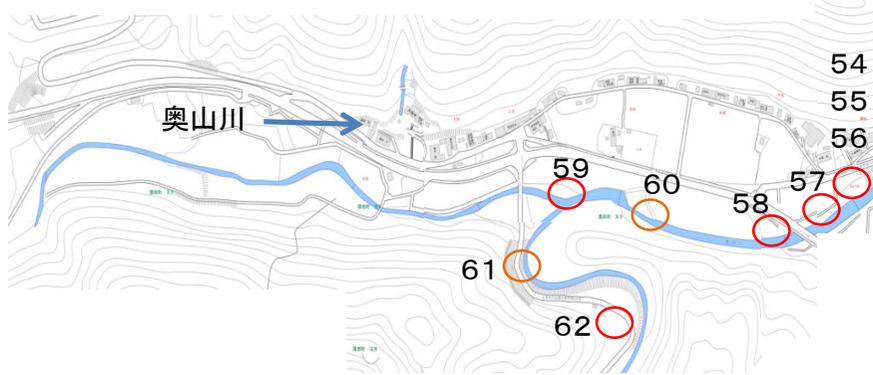

審査結果

実施② (提案箇所43,45,47~58のみ実施 提案箇所46,59は他事業で実施)

現況写真

42

河川堤防で
の隙間は見
られず



43

護岸が
破損

ブロックの
間詰めが
流亡



現況写真

44

護岸ブロックの流亡
認められない



隠れた護岸



石積が隠れて存在



45

土砂の
堆積



現況写真

46

護岸基礎部の露出



護岸の変状

護岸の変状



47

土砂が堆積



現況写真

48

石積み護岸の破損



49

石積み護岸の破損



50

石積み護岸の基礎露出



現況写真

51

張コンクリート
破損



52

岩着部に
設置して
いた根継
が流亡



現況写真

53

土羽護岸の
状況
特に変状無し



54

石積み基礎
部の流亡



55

石積み護
岸が破損
(補修済)



56

岩着部に
設置して
いた根継
が流亡



現況写真

57

土砂堆積



58

護岸背面土砂の流亡



現況写真

59

護岸流亡
(大型土のう)



62

土羽護岸
の変状は
見受けら
れない



支川流入部
の取り合い
破損



府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 280

施設名	由良川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町上司
提案内容	市道上司長谷線から河川までの作業道の設置

現在の状況
平成22年度に、繁茂した竹を伐採した箇所である。過去には、水泳場への降り道として利用されていた小道は存在するが、車両の通行は不可能である。



審査結果

実施しない (作業道は府管理施設でないため。)
