京都府　淀川水系　北川（きたがわ）　事業間連携砂防等事業

京都市（きょうとし）　西京区（にしきょうく）　大原野（おおはらの）　北春日町（きたかすがちょう）

○事業目的

当該箇所は、京都市西京区の山間部に位置し、人家、市道、耕地を保全対象とする危険渓流である。渓流は渓岸浸食が進行し、多量の不安定土砂・転石が渓流内に堆積しており、土石流の発生が懸念されるため、早急に対策を行う必要がある。

○事業概要

保全対象：人家139戸、農地15.7ha、主要地方道、一般府道、市道、京都第二外環状道路
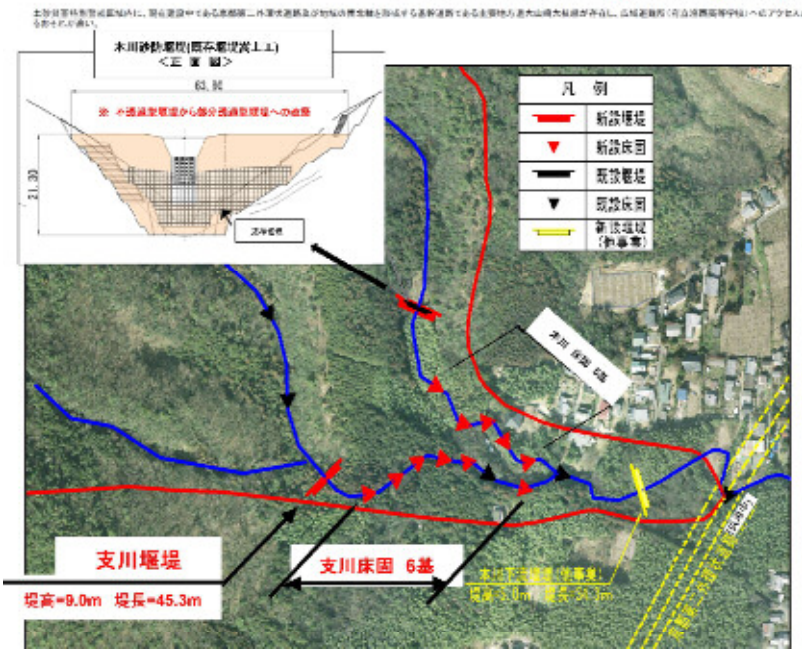
全体計画	R元年度までの実績	R２年度計画
H13～R4 測量設計調査、用地補償、砂防堰堤2基、床固工11基、仮設工（工事用道路）等 事業費：950百万円	測量設計調査、用地補償 仮設工（支川工事用道路） 支川砂防堰堤（完成） 支川流路工（一部） 事業費：500百万円	支川流路工（概成） 支川管理用通路（完成） 本川砂防堰堤嵩上げ(一部) 本川工事用道路 事業費：220百万円
